BYGGET I NÄRTID

v.33 v.34 v.35 v.36 v.37

- Tidplanen för annex-bygget hålls noga, och arbetet är fortfarande i fas.




Den djurgårdsgröna fasadfärgen på annexet är framtagen för att passa med Kungl. Tennishallens tak, entréstolpar, bikupor och andra detaljer i parken.



- Under juli blev stomme, takbjälkar, takskikt och fasader klara, och arbetet med invändiga installationer påbörjades.

- Snickare bygger väggar och den partiella övervåning som ska rymma teknik & el-utrustning.

- I mitten av augusti monteras en spiraltrappa, och färdigställs förråd och andra biutrymmen.

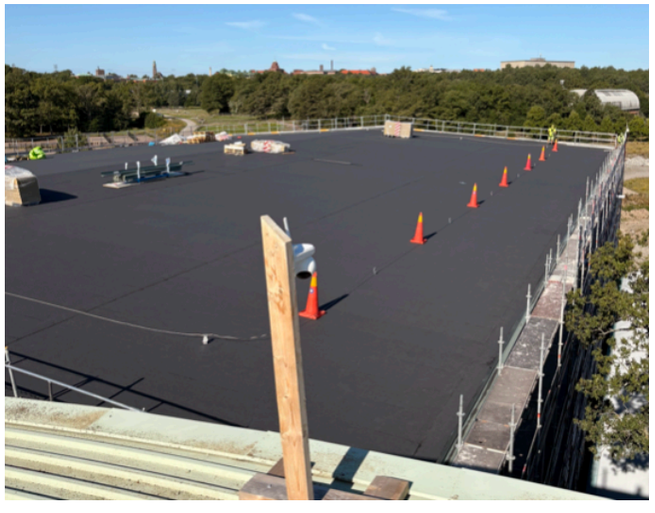

Ovanpå takskikten skall sedum läggas, vilket är ett miljösmart material, optimerat för regn och snö.

- I slutet av månaden monteras belysning, WC:s, kakel, klinker och matta. Ventilation och akustikmaterial kommer på plats.

- För varje färdigställt delmoment görs avstämning med oberoende besiktningsmän.



- Betonggolvet slipas för att sedan flytspacklas innan det är dags att lägga tennisbanorna, i samma kvalitet och färg som på centre courten.
